

	<b>(B)</b>	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
1		ProjetoIZZY	755,9 horas	71,112 dias?	09/09/24 0	17/12/24 08:54	61%
2	✓	Prospecção	32 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
3	✓	PTEC	22 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
4	✓	Estudar o domínio de aplicaçao d	. 10 horas	1,25 dias	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
5	✓	Redigir PTE	10 horas	1,25 dias?	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
6	✓	Revisar PTE	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
7	✓	Est. Prel. Tam	10 horas	1 dia?	09/09/24 0	09/09/24 17:00	100%
8	✓	Estimar Tamanho do Projeto	8 horas	1 dia?	09/09/24 08:00	09/09/24 17:00	100%
9	✓	Revisar Estimar Tamanho do Pro	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
10	✓	Análise	97 horas	12,125 dias?	10/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
11	✓	DRE	48 horas	6 dias	10/09/24 1	18/09/24 10:00	100%
12	✓	Levantar Requisitos do Sistema	20 horas	2,5 dias	10/09/24 10:00	12/09/24 15:00	100%
13	✓	Redigir DRE	22 horas	2,75 dias	12/09/24 15:00	17/09/24 13:00	100%
14	✓	Revisar DRE	6 horas	0,75 dias	17/09/24 12:00	18/09/24 10:00	100%
15	✓	MRB	49 horas	6,125 dias?	18/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
16	✓	Elaborar MRB	45 horas	5,625 dias?	18/09/24 10:00	25/09/24 16:00	100%
17	✓	Revisar MRB	4 horas	0,5 dias?	25/09/24 16:00	26/09/24 11:00	100%
18	✓	Planejamento	188 horas	21,625 dias?	18/09/24 1	17/10/24 16:00	100%
19	✓	Desenvolver Plano de Projeto	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
20	✓	Elaborar Estimativa de Tamanho/E	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
21	✓	Revisar Est. de Tamanho/Esforço	1 hora	0,125 dias?	18/09/24 12:00	18/09/24 14:00	100%
22	✓	Elaborar Cronograma	8 horas	1 dia?	18/09/24 12:00	19/09/24 13:00	100%
23	✓	Revisar Cronograma	1 hora	0,125 dias?	19/09/24 12:00	19/09/24 14:00	100%
24	✓	Elaborar Protótipo	102 horas	12,75 dias?	18/09/24 10:00	04/10/24 17:00	100%
25	✓	Revisar Protótipo	72 horas	13,875 dias?	30/09/24 08:00	17/10/24 16:00	100%
26		Desenvolvimento	374,9 horas	34,237 dias?	17/10/24 1	05/12/24 08:54	35%
27	✓	Sprint 1	132,5 horas	16,688 dias?	17/10/24 1	11/11/24 13:30	100%
28	<b>✓</b>	Implementação	130 horas	16,375 dias?	17/10/24 1	11/11/24 10:00	100%

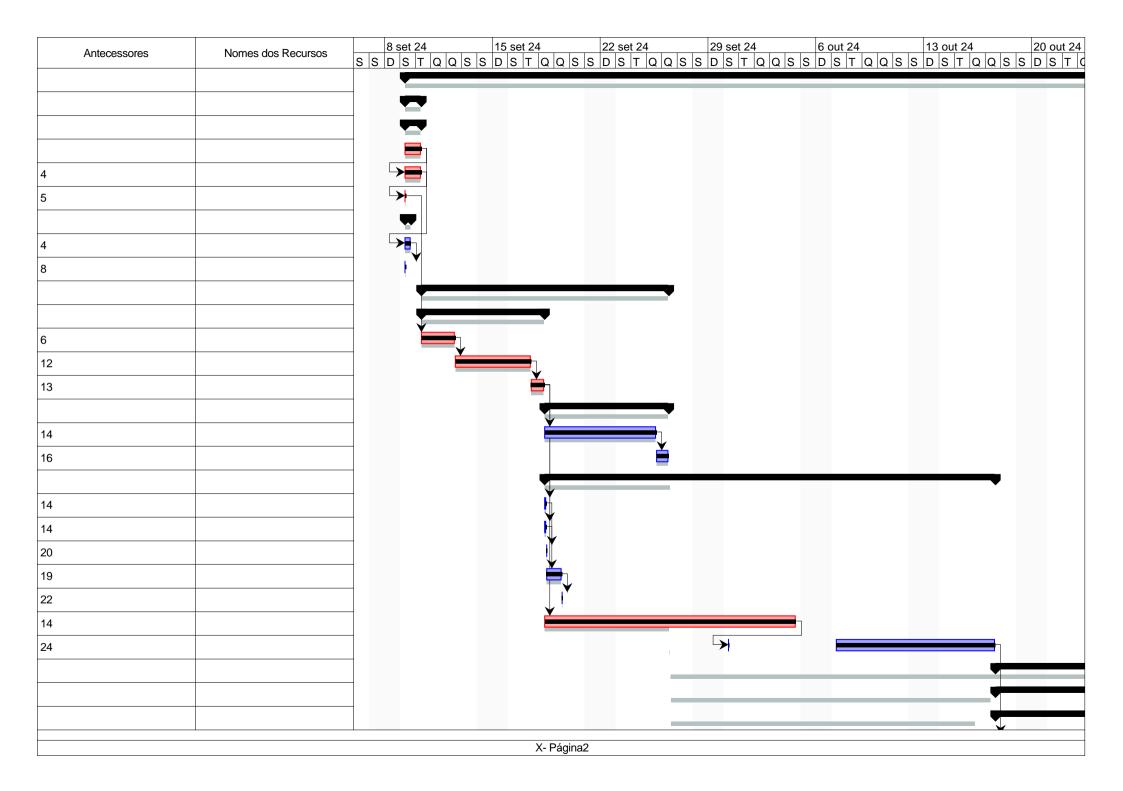


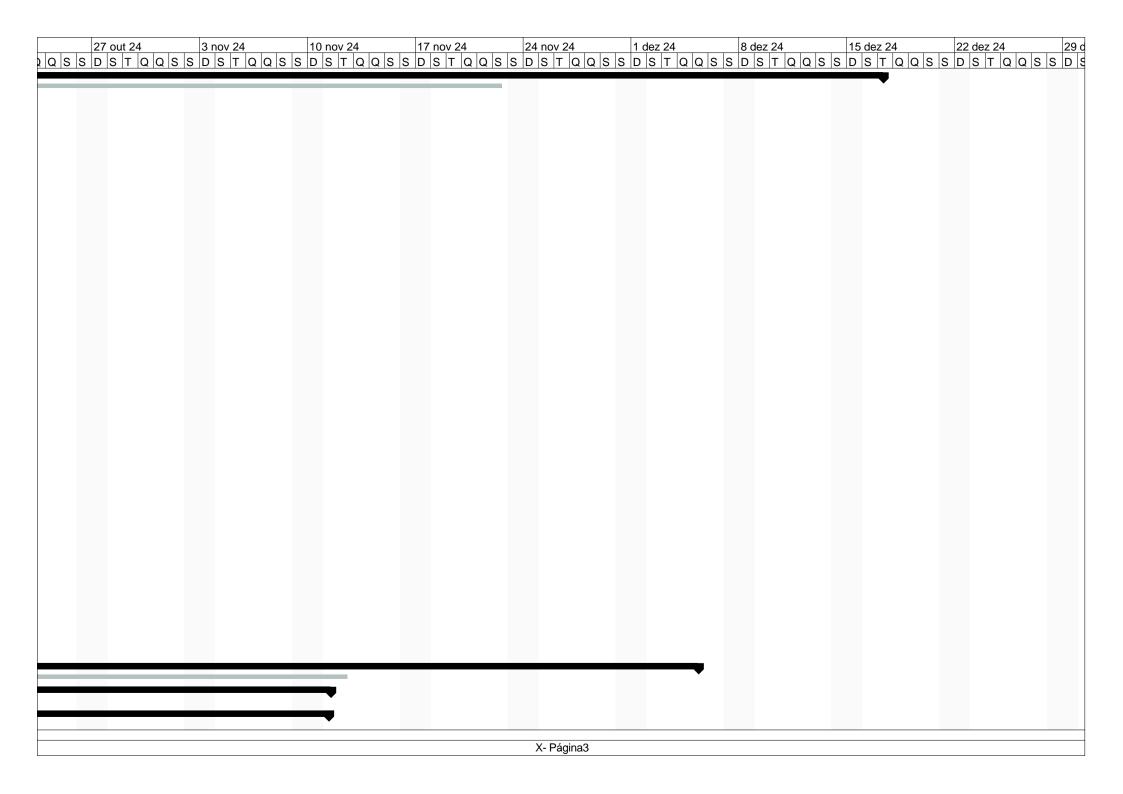

ez 24	) (									
	o (	12 jan 25								
	~   '	Q  S								
X- Página4		_	_							

	<b>(B)</b>	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
29	✓	Manter Usuários	120 horas	15 dias?	17/10/24 16:00	07/11/24 16:00	100%
30	<u> </u>	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias	08/11/24 08:00	08/11/24 09:00	100%
31	✓	Manter IZZY's	8 horas	1 dia?	08/11/24 09:00	11/11/24 09:00	100%
32	<b>□</b>	Realizar Testes	1 hora	0,125 dias?	11/11/24 09:00	11/11/24 10:00	100%
33	✓	Monitoramento e Controle	2 horas	0,25 dias?	11/11/24 1	11/11/24 13:00	100%
34	✓	Atualizar Cronograma	2 horas	0,25 dias?	11/11/24 10:00	11/11/24 13:00	100%
35	⊌	Gerência de Configuração	0,5 horas	0,062 dias?	11/11/24 1	11/11/24 13:30	100%
36	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,5 horas	0,062 dias?	11/11/24 12:00	11/11/24 13:30	100%
37		Sprint 2	146,8 horas	10,85 dias?	11/11/24 1	26/11/24 11:18	0 %
38		Implementação	138 horas	9,75 dias?	11/11/24 1	25/11/24 10:30	0 %
39	O	Manter Membros de um IZZY	50 horas	6,25 dias	12/11/24 08:00	20/11/24 10:00	0%
40		Realizar Testes	10 horas	1,25 dias?	20/11/24 10:00	21/11/24 13:00	0%
41		Manter Atividades	65 horas	8,125 dias?	11/11/24 13:30	21/11/24 14:30	0%
42		Realizar Testes	13 horas	1,625 dias?	21/11/24 14:30	25/11/24 10:30	0%
43		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	25/11/24 1	26/11/24 10:30	0 %
44		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	25/11/24 10:30	26/11/24 10:30	0%
45		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	26/11/24 1	26/11/24 11:18	0 %
46		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	26/11/24 10:30	26/11/24 11:18	0%
47		Sprint 3	44,8 horas	3 dias?	26/11/24 1	29/11/24 11:18	0 %
48		Implementação	36 horas	3 dias?	26/11/24 1	29/11/24 11:18	0 %
49		Manter Fotos	20 horas	2,5 dias	26/11/24 11:18	28/11/24 16:18	0%
50		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	28/11/24 16:18	29/11/24 11:18	0%
51		Relatório de Atividades	10 horas	1,25 dias?	26/11/24 11:18	27/11/24 14:18	0%
52		Realizar Testes	2 horas	0,25 dias?	27/11/24 14:18	27/11/24 16:18	0%
53		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	27/11/24 1	28/11/24 16:18	0 %
54		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	27/11/24 16:18	28/11/24 16:18	0%
55		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	28/11/24 1	29/11/24 08:06	0 %
56		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	28/11/24 16:18	29/11/24 08:06	0%
	-			X- Página	n5		<u> </u>


Antecessores	Nomes dos Recursos	8 S S D	set 24	15 se	t 24	22 set 2	4 0 0 s s	29 set 24	0 S S D	out 24	13 c	out 24	20 out 24 S S D S T
25				0 12 10	,	0 12 10 1.				<u> </u>	9   0   2   1		0  0  2  0  .
29													
30													
31													
												_	
32												_	
34													
												_	
												_	
36												_	
39													
36												_	
41													
42													
44													
46													
49													
46													
51													
52													
54													
	•	'			X- Página	6							

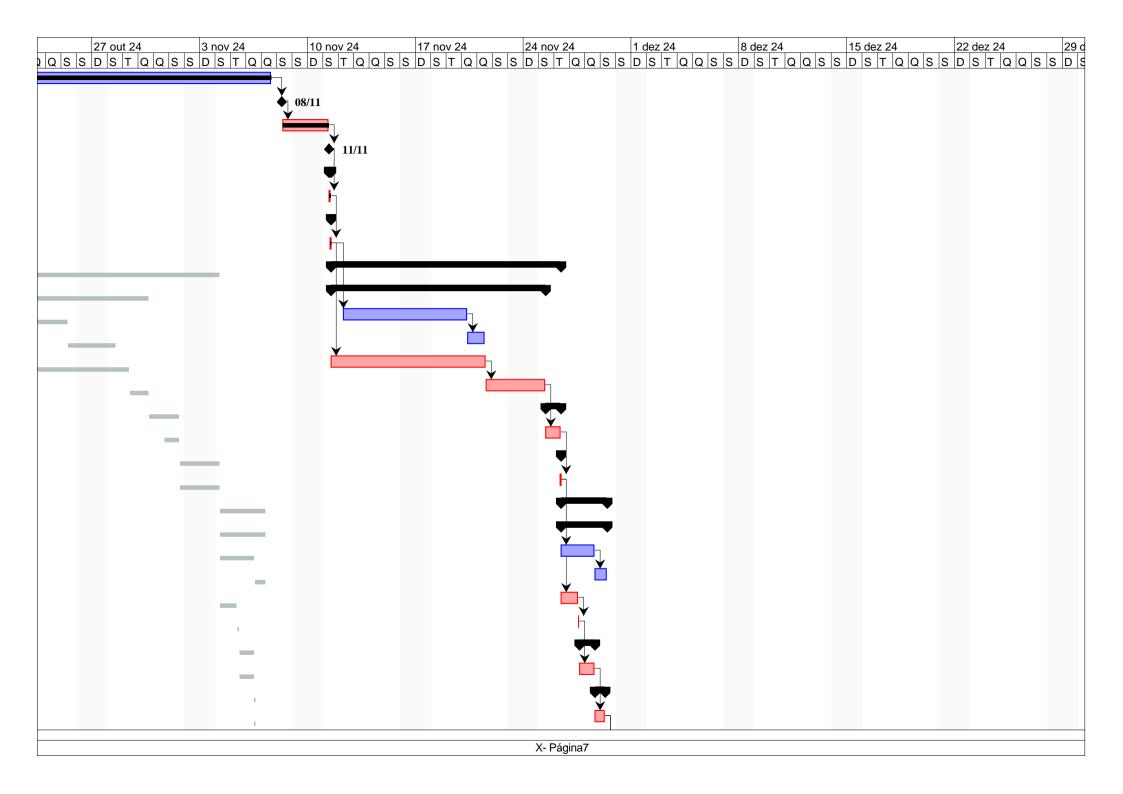

ez 2	4				5 j	an	25					12	jar	1 2	5		
T	Q	Q	S	S	D	s	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	s
							X-	Pá	gina	a8							

	<b>(b)</b>	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
57		Sprint 4	50,8 horas	4,1 dias?	29/11/24 0	05/12/24 08:54	0 %
58		Implementação	42 horas	3 dias?	29/11/24 0	04/12/24 08:06	0 %
59		Relatório de Atividades Atrasa	15 horas	1,875 dias	29/11/24 08:06	02/12/24 16:06	0%
60		Realizar Testes	3 horas	0,375 dias	02/12/24 16:06	03/12/24 10:06	0%
61		Relatório de Participação dos	20 horas	2,5 dias?	29/11/24 08:06	03/12/24 13:06	0%
62		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	03/12/24 13:06	04/12/24 08:06	0%
63		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	04/12/24 0	05/12/24 08:06	0 %
64		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	04/12/24 08:06	05/12/24 08:06	0%
65		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	05/12/24 0	05/12/24 08:54	0 %
66		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	05/12/24 08:06	05/12/24 08:54	0%
67		Fechamento	64 horas	8 dias?	05/12/24 0	17/12/24 08:54	0 %
68		Apresentação do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	05/12/24 08:54	09/12/24 08:54	0%
69		Entrega do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	09/12/24 08:54	11/12/24 08:54	0%
70		Implantação do sistema	32 horas	4 dias?	11/12/24 08:54	17/12/24 08:54	0%
71	o l	Finalização	0 horas	0 dias?	17/12/24 08:54	17/12/24 08:54	0%

Antecessores	Nomes dos Recursos		8 set 2	24	1	5 set 2	24	22	2 set 24		29	set 24 S T Q (		6 o	ut 24		13	out 2	4	2	out 2
		SS	D S	T  Q  Q	S  S  C	)  S  T	Q  Q  S	S  S  D	S  T  Q	Q  S	S D	S T Q	2   S   S	D	S  T  Q	Q  S	S D	S  T	Q  Q  S	8  S  D	S T
56																					
59																					
56																					
61																					
62																					
62																					
64																					
66																					
68																					
69																					
70																					
							X- Página	a10													

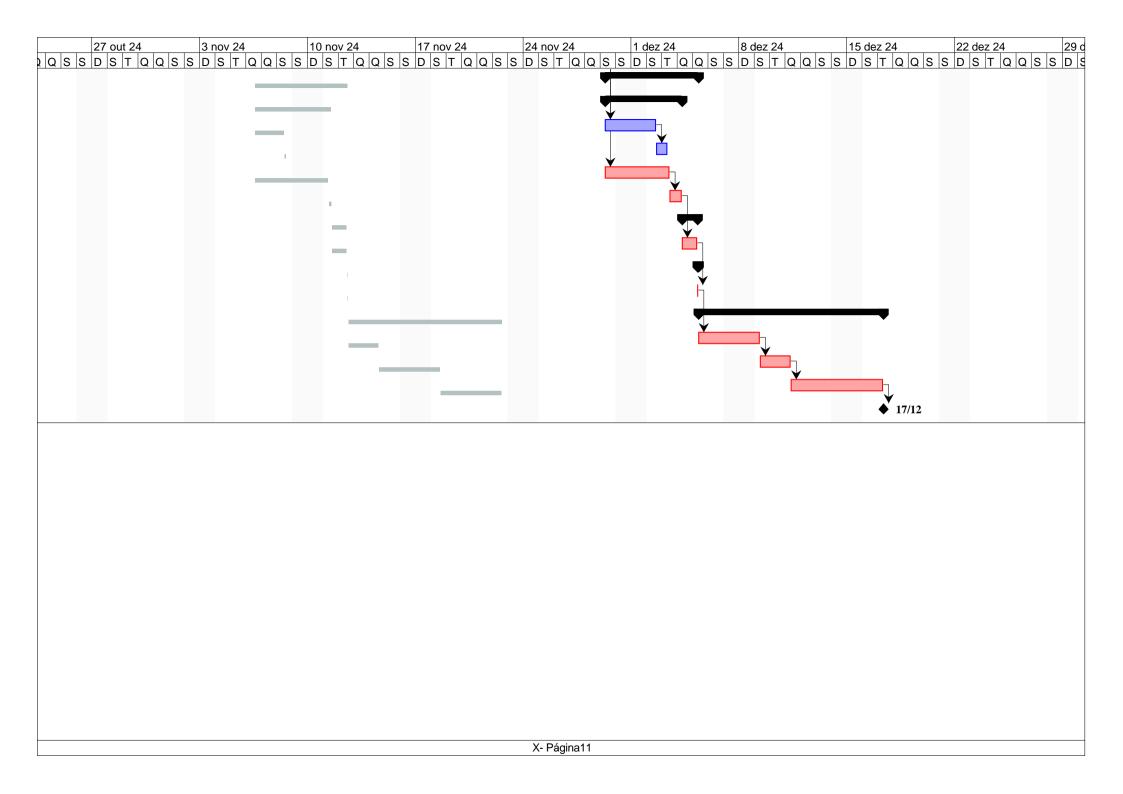

ez 24 3 T Q	Q	5 5	5 j	an S	25 T	Q	Q	S	S	12 D	jar S	1 2: T	Q	Q	S
IT Q	Q	SS	S D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
					X- I	Páo	yina	12							
