

	<b>(A)</b>	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
1		ProjetoIZZY	740,2 horas	69,025 dias?	09/09/24 0	13/12/24 08:12	46%
2	✓	Prospecção	32 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
3	✓	PTEC	22 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
4	✓	Estudar o domínio de aplicaçao d	10 horas	1,25 dias	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
5	✓	Redigir PTE	10 horas	1,25 dias?	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
6	✓	Revisar PTE	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
7	✓	Est. Prel. Tam	10 horas	1 dia?	09/09/24 0	09/09/24 17:00	100%
8	<b>✓</b>	Estimar Tamanho do Projeto	8 horas	1 dia?	09/09/24 08:00	09/09/24 17:00	100%
9	✓	Revisar Estimar Tamanho do Pro	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
10	✓	Análise	97 horas	12,125 dias?	10/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
11	<b>V</b>	DRE	48 horas	6 dias	10/09/24 1	18/09/24 10:00	100%
12	<b>✓</b>	Levantar Requisitos do Sistema	20 horas	2,5 dias	10/09/24 10:00	12/09/24 15:00	100%
13	✓	Redigir DRE	22 horas	2,75 dias	12/09/24 15:00	17/09/24 13:00	100%
14	✓	Revisar DRE	6 horas	0,75 dias	17/09/24 12:00	18/09/24 10:00	100%
15	✓	MRB	49 horas	6,125 dias?	18/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
16	✓	Elaborar MRB	45 horas	5,625 dias?	18/09/24 10:00	25/09/24 16:00	100%
17	✓	Revisar MRB	4 horas	0,5 dias?	25/09/24 16:00	26/09/24 11:00	100%
18	✓	Planejamento	188 horas	21,625 dias?	18/09/24 1	17/10/24 16:00	100%
19	✓	Desenvolver Plano de Projeto	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
20	✓	Elaborar Estimativa de Tamanho/E	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
21	✓	Revisar Est. de Tamanho/Esforço	1 hora	0,125 dias?	18/09/24 12:00	18/09/24 14:00	100%
22	✓	Elaborar Cronograma	8 horas	1 dia?	18/09/24 12:00	19/09/24 13:00	100%
23	✓	Revisar Cronograma	1 hora	0,125 dias?	19/09/24 12:00	19/09/24 14:00	100%
24	✓	Elaborar Protótipo	102 horas	12,75 dias?	18/09/24 10:00	04/10/24 17:00	100%
25	✓	Revisar Protótipo	72 horas	13,875 dias?	30/09/24 08:00	17/10/24 16:00	100%
26		Desenvolvimento	359,2 horas	32,15 dias?	17/10/24 1	03/12/24 08:12	0 %
27		Sprint 1	116,8 horas	14,6 dias?	17/10/24 1	07/11/24 11:48	0 %
28		Implementação	108 horas	13,5 dias?	17/10/24 1	06/11/24 11:00	0 %

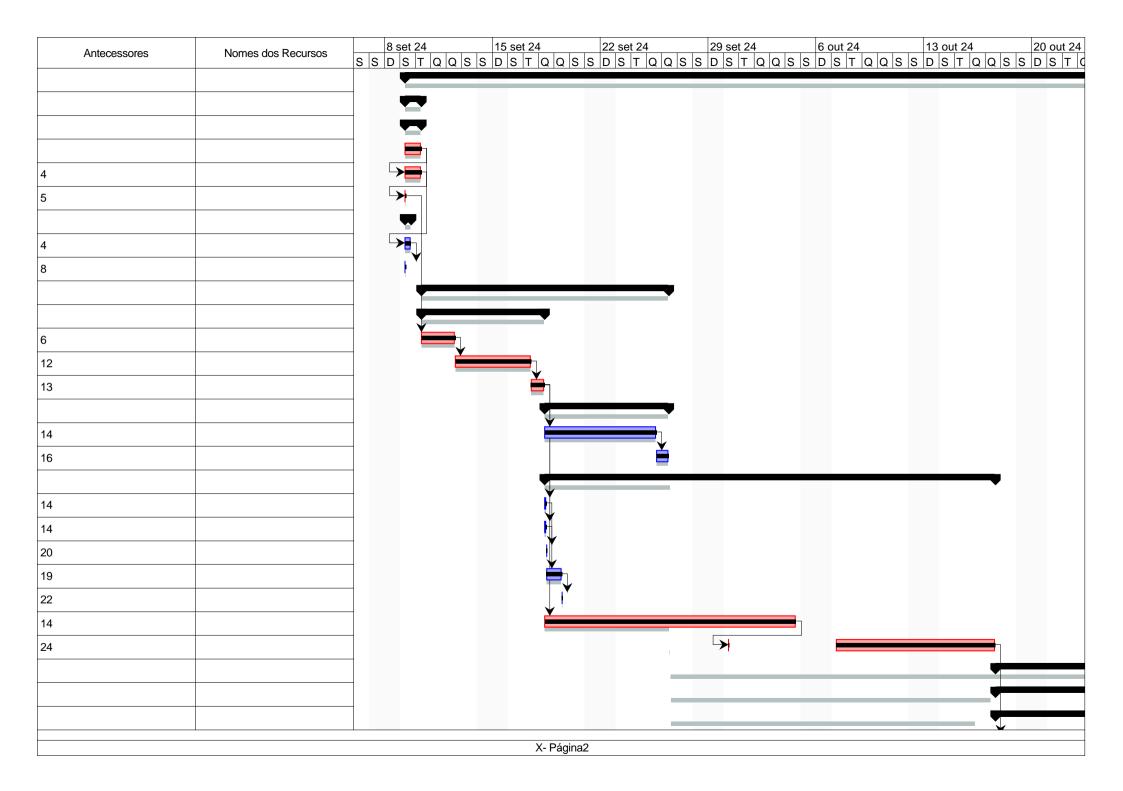


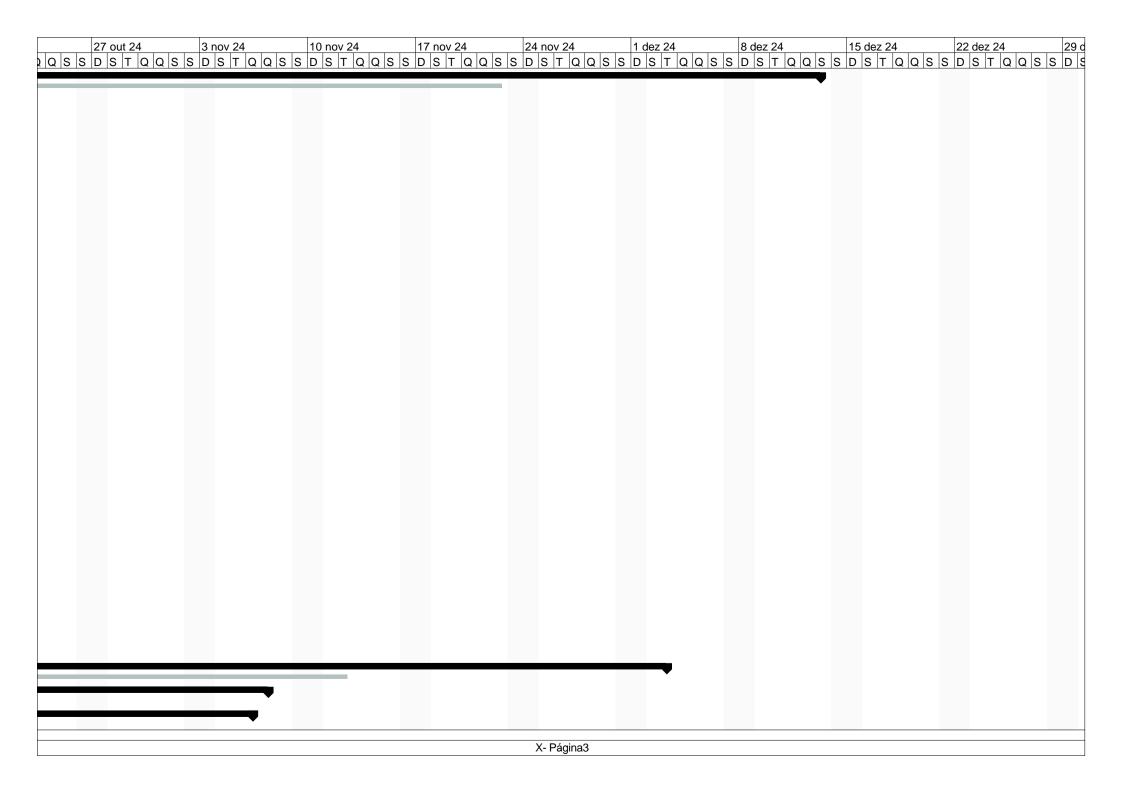

												40
ez 24	4	0	S	9	5 j	an c	25 T	0	0	s	0	12 D
)   I	Ų	Ų	S	<u>S</u>	ען	<u> </u> S		Ų	Ų	S	<u> </u>	ען
					- P	ádi	na/	l				
				^	- P	ayı	ııa4	•				

	<b>(B)</b>	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
29		Manter Usuários	40 horas	5 dias?	17/10/24 16:00	24/10/24 16:00	0%
30		Realizar Testes	8 horas	1 dia	24/10/24 16:00	25/10/24 16:00	0%
31		Manter IZZY's	50 horas	6,25 dias?	25/10/24 16:00	05/11/24 09:00	0%
32		Realizar Testes	10 horas	1,25 dias?	05/11/24 09:00	06/11/24 11:00	0%
33		Monitoramento e Controle	8 horas	1 dia?	06/11/24 1	07/11/24 11:00	0 %
34		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	06/11/24 11:00	07/11/24 11:00	0%
35		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias?	07/11/24 1	07/11/24 11:48	0 %
36		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias?	07/11/24 11:00	07/11/24 11:48	0%
37		Sprint 2	146,8 horas	10,85 dias?	07/11/24 1	22/11/24 10:36	0 %
38		Implementação	138 horas	9,75 dias?	07/11/24 1	21/11/24 09:48	0 %
39		Manter Membros de um IZZY	50 horas	6,25 dias	07/11/24 11:48	15/11/24 14:48	0%
40		Realizar Testes	10 horas	1,25 dias?	15/11/24 14:48	18/11/24 16:48	0%
41		Manter Atividades	65 horas	8,125 dias?	07/11/24 11:48	19/11/24 13:48	0%
42		Realizar Testes	13 horas	1,625 dias?	19/11/24 13:48	21/11/24 09:48	0%
43		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	21/11/24 0	22/11/24 09:48	0 %
44		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	21/11/24 09:48	22/11/24 09:48	0%
45		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	22/11/24 0	22/11/24 10:36	0 %
46		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	22/11/24 09:48	22/11/24 10:36	0%
47		Sprint 3	44,8 horas	3 dias?	22/11/24 1	27/11/24 10:36	0 %
48		Implementação	36 horas	3 dias?	22/11/24 1	27/11/24 10:36	0 %
49		Manter Fotos	20 horas	2,5 dias	22/11/24 10:36	26/11/24 15:36	0%
50		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	26/11/24 15:36	27/11/24 10:36	0%
51		Relatório de Atividades	10 horas	1,25 dias?	22/11/24 10:36	25/11/24 13:36	0%
52		Realizar Testes	2 horas	0,25 dias?	25/11/24 13:36	25/11/24 15:36	0%
53		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	25/11/24 1	26/11/24 15:36	0 %
54		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	25/11/24 15:36	26/11/24 15:36	0%
55		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	26/11/24 1	26/11/24 16:24	0 %
56		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	26/11/24 15:36	26/11/24 16:24	0%
				X- Página	a5		


Antecessores	Nomes dos Recursos	8 S S F	set 24	15 se	et 24	22 set	24	29 set 24	0 8 8 0	6 out 24	13 3 S S D	out 24	20 out 24 S S D S T 0
25			, 0 1.   4   4   5	, 10 15 10	<u> </u>			D   O   1.   Q		<i>y</i>   0   1   Q   1	<u> </u>		
29													
30												_	
31												_	
												_	
32												_	
34													
												_	
												_	
36												_	
39													
36												_	
41													
42													
44													
46													
49													
46													
51													
52													
54													
	•	'			X- Página	6							

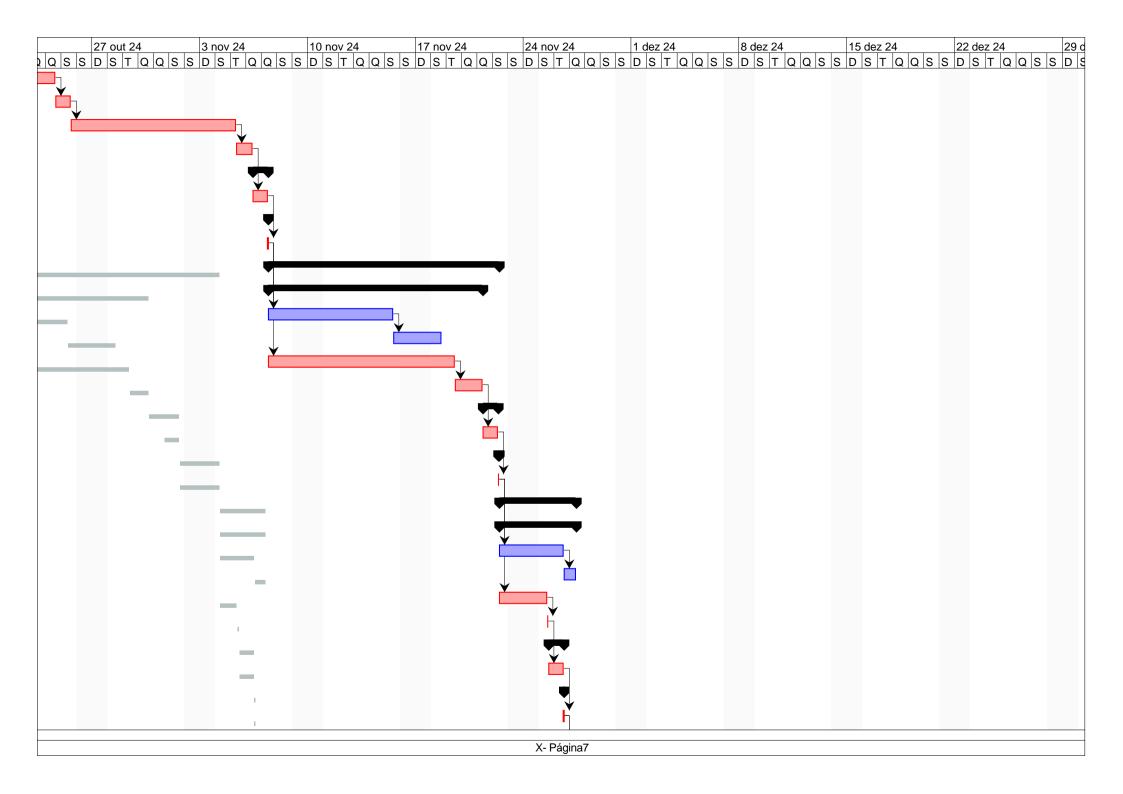

ez 24	Q S	5 ja	an 25 S T	QQ	s s	12 D
		X- Pa	ágina8	3		

	<b>(b)</b>	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
57		Sprint 4	50,8 horas	4,1 dias?	26/11/24 1	03/12/24 08:12	0 %
58		Implementação	42 horas	3 dias?	26/11/24 1	29/11/24 16:24	0 %
59		Relatório de Atividades Atrasa	15 horas	1,875 dias	26/11/24 16:24	28/11/24 15:24	0%
60		Realizar Testes	3 horas	0,375 dias	28/11/24 15:24	29/11/24 09:24	0%
61		Relatório de Participação dos	20 horas	2,5 dias?	26/11/24 16:24	29/11/24 11:24	0%
62		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	29/11/24 11:24	29/11/24 16:24	0%
63		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	29/11/24 1	02/12/24 16:24	0 %
64		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	29/11/24 16:24	02/12/24 16:24	0%
65		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	02/12/24 1	03/12/24 08:12	0 %
66		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	02/12/24 16:24	03/12/24 08:12	0%
67		Fechamento	64 horas	8 dias?	03/12/24 0	13/12/24 08:12	0 %
68		Apresentação do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	03/12/24 08:12	05/12/24 08:12	0%
69		Entrega do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	05/12/24 08:12	09/12/24 08:12	0%
70		Implantação do sistema	32 horas	4 dias?	09/12/24 08:12	13/12/24 08:12	0%
71	•	Finalização	0 horas	0 dias?	13/12/24 08:12	13/12/24 08:12	0%

Antecessores	Nomes dos Recursos		8 set 2	24	1	5 set 2	24	22	2 set 24		29	set 24 S T Q (		6 o	ut 24		13	out 2	4	2	out 2
		SS	D S	T  Q  Q	S  S  E	)  S  T	Q  Q  S	S  S  D	S  T  Q	Q  S	S D	S T Q	2   S   S	D	S  T  Q	Q  S	S D	S  T	Q  Q  S	8  S  D	S T
56																					
59																					
56																					
61																					
62																					
62																					
64																					
66																					
68																					
69																					
70																					
							X- Página	a10													

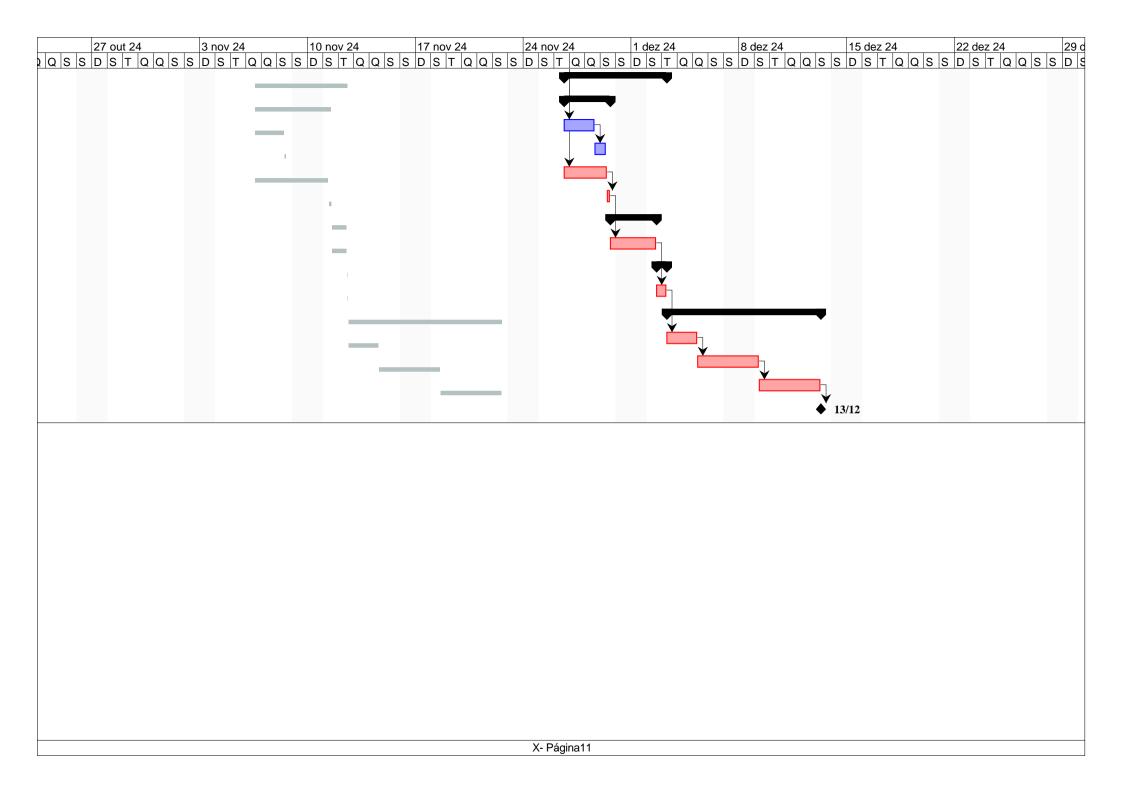

ez 2	4				5 j	an	25					12
ez 2	Q	Q	S	S	D	s	Т	Q	Q	S	s	D
				Y	. Pá	ıgin	a1'	2				$\dashv$
				^-	- F	ıgırı	a I					
