

	(B)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
1		ProjetoIZZY	769,2 horas	72,65 dias?	09/09/24 0	18/12/24 14:12	6 2 %
2	✓	Prospecção	32 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
3	✓	PTEC	22 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
4	✓	Estudar o domínio de aplicaçao d	10 horas	1,25 dias	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
5	✓	Redigir PTE	10 horas	1,25 dias?	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
6	✓	Revisar PTE	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
7	✓	Est. Prel. Tam	10 horas	1 dia?	09/09/24 0	09/09/24 17:00	100%
8	✓	Estimar Tamanho do Projeto	8 horas	1 dia?	09/09/24 08:00	09/09/24 17:00	100%
9	✓	Revisar Estimar Tamanho do Pro	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
10	✓	Análise	97 horas	12,125 dias?	10/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
11	✓	DRE	48 horas	6 dias	10/09/24 1	18/09/24 10:00	100%
12	✓	Levantar Requisitos do Sistema	20 horas	2,5 dias	10/09/24 10:00	12/09/24 15:00	100%
13	✓	Redigir DRE	22 horas	2,75 dias	12/09/24 15:00	17/09/24 13:00	100%
14	✓	Revisar DRE	6 horas	0,75 dias	17/09/24 12:00	18/09/24 10:00	100%
15	✓	MRB	49 horas	6,125 dias?	18/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
16	✓	Elaborar MRB	45 horas	5,625 dias?	18/09/24 10:00	25/09/24 16:00	100%
17	✓	Revisar MRB	4 horas	0,5 dias?	25/09/24 16:00	26/09/24 11:00	100%
18	✓	Planejamento	188 horas	21,625 dias?	18/09/24 1	17/10/24 16:00	100%
19	✓	Desenvolver Plano de Projeto	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
20	✓	Elaborar Estimativa de Tamanho/E	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
21	✓	Revisar Est. de Tamanho/Esforço	1 hora	0,125 dias?	18/09/24 12:00	18/09/24 14:00	100%
22	✓	Elaborar Cronograma	8 horas	1 dia?	18/09/24 12:00	19/09/24 13:00	100%
23	✓	Revisar Cronograma	1 hora	0,125 dias?	19/09/24 12:00	19/09/24 14:00	100%
24	✓	Elaborar Protótipo	102 horas	12,75 dias?	18/09/24 10:00	04/10/24 17:00	100%
25	✓	Revisar Protótipo	72 horas	13,875 dias?	30/09/24 08:00	17/10/24 16:00	100%
26		Desenvolvimento	388,2 horas	35,775 dias?	17/10/24 1	06/12/24 14:12	38%
27	✓	Sprint 1	145,8 horas	18,225 dias?	17/10/24 1	13/11/24 08:48	100%
28	✓	Implementação	137 horas	17,125 dias?	17/10/24 1	12/11/24 08:00	100%

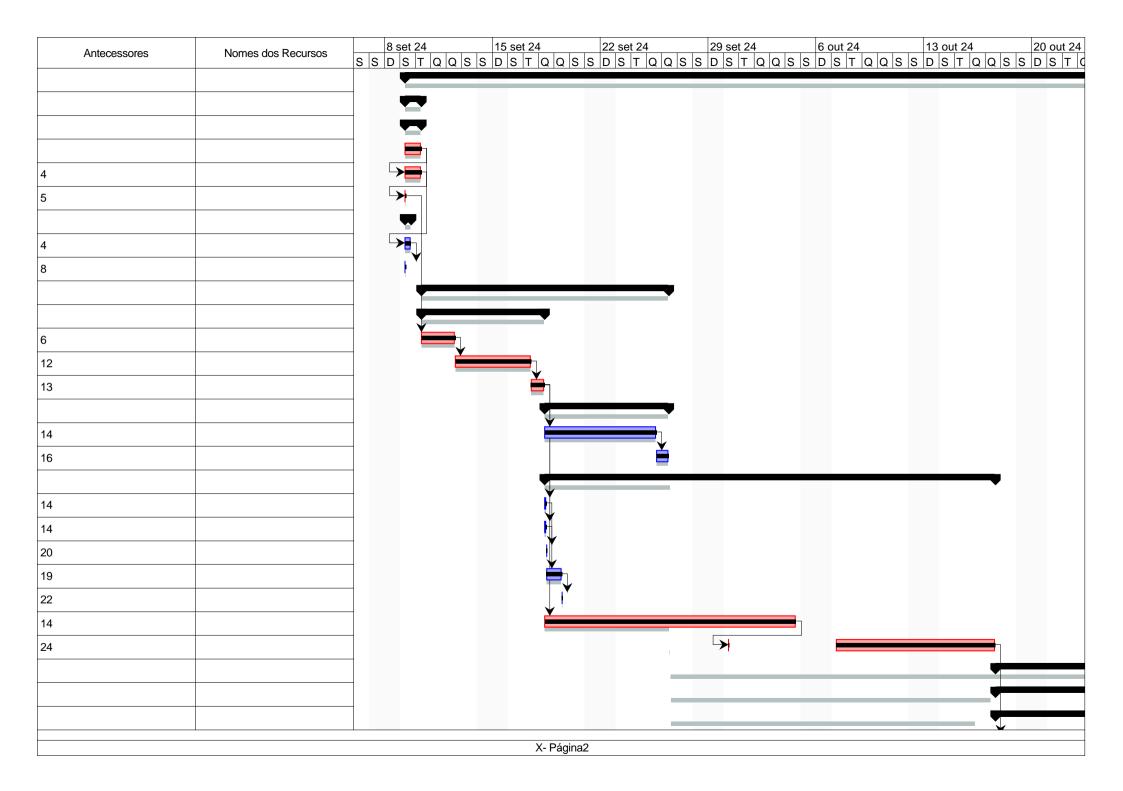


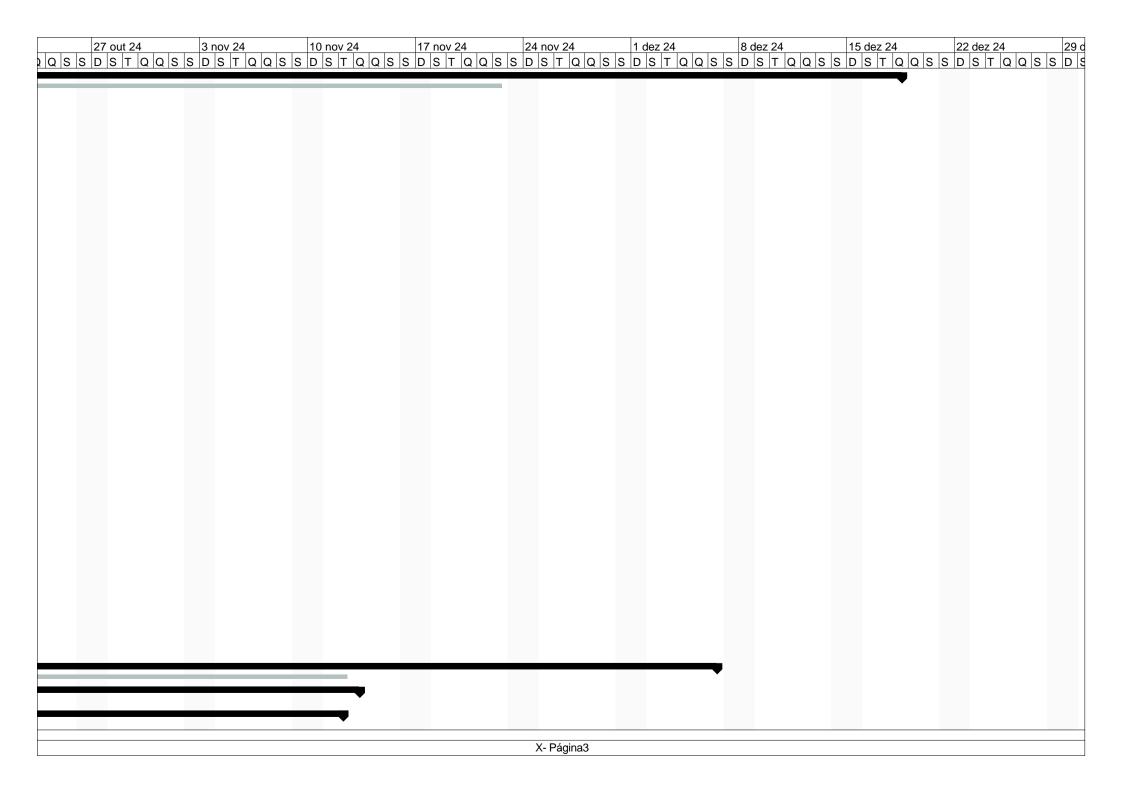

ez 24 5 jan 25 12 jan 25 19 jan 25 26 j T Q Q S S D S T Q Q	ian 25 S T Q Q								
	<u>S T Q Q</u>								
V D/4									
X- Página4									

	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
29	✓	Manter Usuários	129 horas	16,125 dias?	17/10/24 16:00	08/11/24 17:00	100%
30	✓	Realizar Testes	0 horas	0 dias	11/11/24 08:00	11/11/24 08:00	100%
31	✓	Manter IZZY's	8 horas	1 dia?	11/11/24 08:00	11/11/24 17:00	100%
32	□	Realizar Testes	0 horas	0 dias?	12/11/24 08:00	12/11/24 08:00	100%
33	✓	Monitoramento e Controle	8 horas	1 dia?	12/11/24 0	12/11/24 17:00	100%
34	✓	Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	12/11/24 08:00	12/11/24 17:00	100%
35	✓	Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias?	13/11/24 0	13/11/24 08:48	100%
36	✓	Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias?	13/11/24 08:00	13/11/24 08:48	100%
37		Sprint 2	146,8 horas	10,85 dias?	13/11/24 0	27/11/24 16:36	0 %
38		Implementação	138 horas	9,75 dias?	13/11/24 0	26/11/24 15:48	0 %
39		Manter Membros de um IZZY	50 horas	6,25 dias	13/11/24 08:48	21/11/24 10:48	0%
40		Realizar Testes	10 horas	1,25 dias?	21/11/24 10:48	22/11/24 13:48	0%
41		Manter Atividades	65 horas	8,125 dias?	13/11/24 08:48	25/11/24 09:48	0%
42		Realizar Testes	13 horas	1,625 dias?	25/11/24 09:48	26/11/24 15:48	0%
43		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	26/11/24 1	27/11/24 15:48	0 %
44		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	26/11/24 15:48	27/11/24 15:48	0%
45		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	27/11/24 1	27/11/24 16:36	0 %
46		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	27/11/24 15:48	27/11/24 16:36	0%
47		Sprint 3	44,8 horas	3 dias?	27/11/24 1	02/12/24 16:36	0 %
48		Implementação	36 horas	3 dias?	27/11/24 1	02/12/24 16:36	0 %
49		Manter Fotos	20 horas	2,5 dias	27/11/24 16:36	02/12/24 11:36	0%
50		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	02/12/24 11:36	02/12/24 16:36	0%
51		Relatório de Atividades	10 horas	1,25 dias?	27/11/24 16:36	29/11/24 09:36	0%
52		Realizar Testes	2 horas	0,25 dias?	29/11/24 09:36	29/11/24 11:36	0%
53		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	29/11/24 1	02/12/24 11:36	0 %
54		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	29/11/24 11:36	02/12/24 11:36	0%
55		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	02/12/24 1	02/12/24 13:24	0 %
56		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	02/12/24 11:36	02/12/24 13:24	0%
	•			X- Página	15		


Antecessores	Nomes dos Recursos	8 s	et 24 S T Q Q S	15 se	t 24	22 set 2	24 Q Q S S	29 set 24	0 S S D	out 24	13 c	out 24	20 out 24 S S D S T
25			<u> </u>	0 12 10	,	0 12 10 1.		12 10 1. 10		0 .	,		0 0 2 0 .
29													
30													
31													
												_	
32												_	
34													
												_	
36													
39													
36												_	
41													
42													
44													
46													
49													
46													
51													
52													
54													
	•	<u> </u>			X- Página	6							

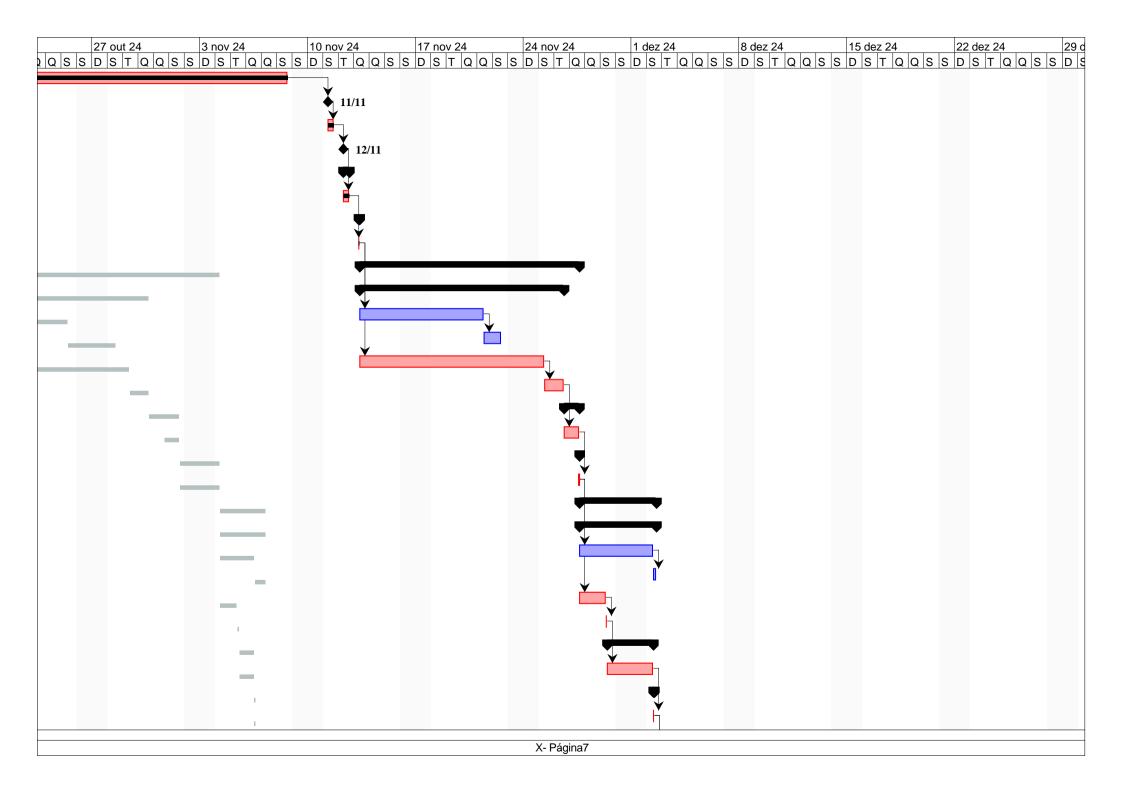

22 4																																
	ez	24	ŀ,				5 j	an	25	1				12	ja	ın 2	25	_			19	jar	ի 2։	5	1		1	26	jar	ր 2	5	
Y, Dáning	} T		Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
Y, Páring																																
Y. Páring																																
Y. Páning																																
Y. Páning																																
Y. Páning																																
V. Páringo																																
V. Páring																																
V. Páning																																
V. Páring																																
V. Páning																																
V. Páring																																
V. Páring																																
V. Pásing																																
Y. Pásing																																
Y. Páring																																
Y. Pásing																																
Y. Pásing?																																
Y. Pásing?																																
Y. Pásing?																																
Y. Pásing?																																
Y. Pázings																																
Y. Pázings																																
Y. Pázina?																																
Y. Pásins9																																
Y. Pásins9																																
Y. Pásina?																																
Y. Pásings																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásings																																
Y. Pásings																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Pásinas																																
Y. Págings																																
Y. Págings																																
Y. Págings																																
Y. Págings																																
Y. Págings																																
Y. Dágings																																
Y. Dágings																																
X - Hadinak		_																														
A- r agirido																																

	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
57		Sprint 4	50,8 horas	4,1 dias?	02/12/24 1	06/12/24 14:12	0 %
58		Implementação	42 horas	3 dias?	02/12/24 1	05/12/24 13:24	0 %
59		Relatório de Atividades Atrasa	15 horas	1,875 dias	02/12/24 13:24	04/12/24 11:24	0%
60		Realizar Testes	3 horas	0,375 dias	04/12/24 11:24	04/12/24 15:24	0%
61		Relatório de Participação dos	20 horas	2,5 dias?	02/12/24 13:24	05/12/24 08:24	0%
62		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	05/12/24 08:24	05/12/24 13:24	0%
63		Monitoramento de Controle	8 horas	1 dia?	05/12/24 1	06/12/24 13:24	0 %
64		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	05/12/24 13:24	06/12/24 13:24	0%
65		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	06/12/24 1	06/12/24 14:12	0 %
66		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	06/12/24 13:24	06/12/24 14:12	0%
67		Fechamento	64 horas	8 dias?	06/12/24 1	18/12/24 14:12	0 %
68		Apresentação do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	06/12/24 14:12	10/12/24 14:12	0%
69		Entrega do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	10/12/24 14:12	12/12/24 14:12	0%
70		Implantação do sistema	32 horas	4 dias?	12/12/24 14:12	18/12/24 14:12	0%
71	O	Finalização	0 horas	0 dias?	18/12/24 14:12	18/12/24 14:12	0%

Antecessores	Nomes dos Recursos		8 set 2	24	1	5 set 2	24	22	2 set 24		29	set 24 S T Q (6 o	ut 24		13	out 2	4	2	out 2
		SS	D S	T Q Q	S S C) S T	Q Q S	S S D	S T Q	Q S	S D	S T Q	2 S S	D	S T Q	Q S	S D	S T	Q Q S	8 S D	S T
56																					
59																					
56																					
61																					
62																					
62																					
64																					
66																					
68																					
69																					
70																					
							X- Página	a10													

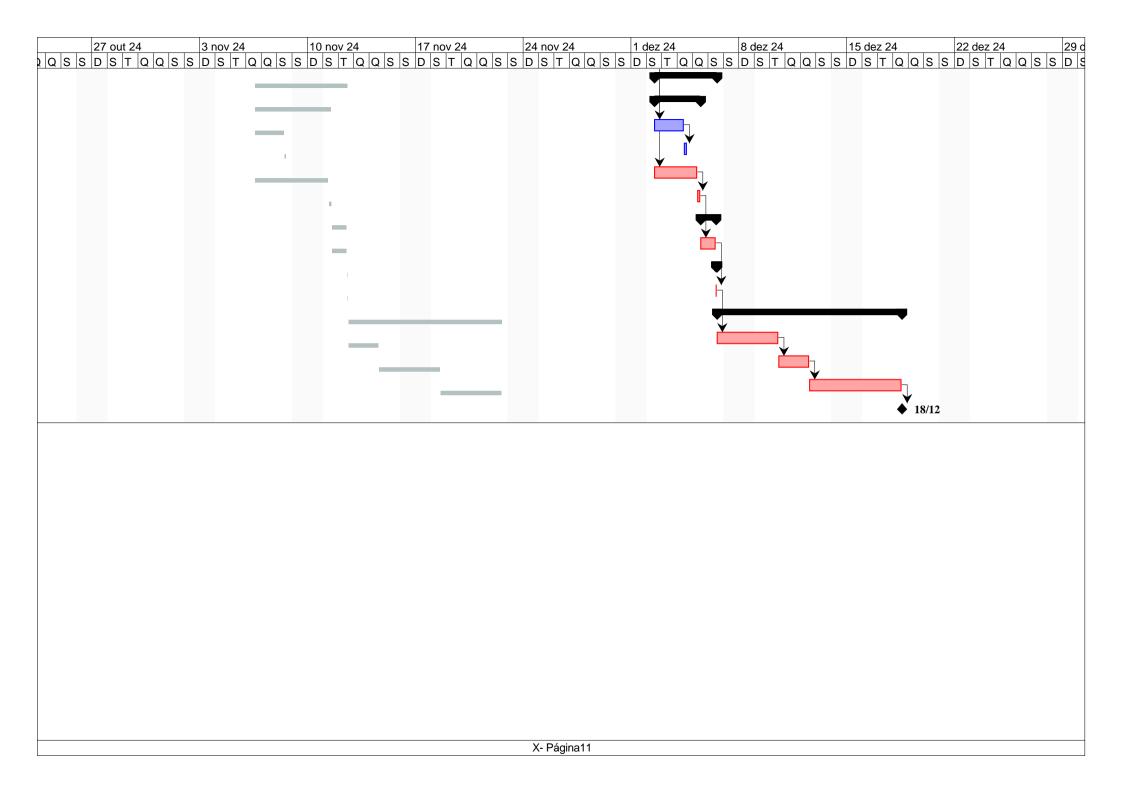

22 4 5 3 3 25 12 3 25 19 3 3 25 26 3 25 25 17 Q Q S S D S T Q		T	1	1
	ez 24 5 jan 25	12 jan 25	19 jan 25	26 jan 25
	T Q Q S S D S T Q Q S S	S D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q
