

	(B)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
1		ProjetoIZZY	772,2 horas	70,025 dias?	09/09/24 0	16/12/24 08:12	4 4 %
2	✓	Prospecção	32 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
3	✓	PTEC	22 horas	1,25 dias?	09/09/24 0	10/09/24 10:00	100%
4	✓	Estudar o domínio de aplicaçao d	10 horas	1,25 dias	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
5	✓	Redigir PTE	10 horas	1,25 dias?	09/09/24 08:00	10/09/24 10:00	100%
6	✓	Revisar PTE	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
7	✓	Est. Prel. Tam	10 horas	1 dia?	09/09/24 0	09/09/24 17:00	100%
8	✓	Estimar Tamanho do Projeto	8 horas	1 dia?	09/09/24 08:00	09/09/24 17:00	100%
9	✓	Revisar Estimar Tamanho do Pro	2 horas	0,25 dias?	09/09/24 08:00	09/09/24 10:00	100%
10	✓	Análise	97 horas	12,125 dias?	10/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
11	✓	DRE	48 horas	6 dias	10/09/24 1	18/09/24 10:00	100%
12	✓	Levantar Requisitos do Sistema	20 horas	2,5 dias	10/09/24 10:00	12/09/24 15:00	100%
13	✓	Redigir DRE	22 horas	2,75 dias	12/09/24 15:00	17/09/24 13:00	100%
14	✓	Revisar DRE	6 horas	0,75 dias	17/09/24 12:00	18/09/24 10:00	100%
15	✓	MRB	49 horas	6,125 dias?	18/09/24 1	26/09/24 11:00	100%
16	✓	Elaborar MRB	45 horas	5,625 dias?	18/09/24 10:00	25/09/24 16:00	100%
17	✓	Revisar MRB	4 horas	0,5 dias?	25/09/24 16:00	26/09/24 11:00	100%
18	✓	Planejamento	188 horas	21,625 dias?	18/09/24 1	17/10/24 16:00	100%
19	✓	Desenvolver Plano de Projeto	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
20	✓	Elaborar Estimativa de Tamanho/E	2 horas	0,25 dias?	18/09/24 10:00	18/09/24 13:00	100%
21	✓	Revisar Est. de Tamanho/Esforço	1 hora	0,125 dias?	18/09/24 12:00	18/09/24 14:00	100%
22	✓	Elaborar Cronograma	8 horas	1 dia?	18/09/24 12:00	19/09/24 13:00	100%
23	₩	Revisar Cronograma	1 hora	0,125 dias?	19/09/24 12:00	19/09/24 14:00	100%
24	✓	Elaborar Protótipo	102 horas	12,75 dias?	18/09/24 10:00	04/10/24 17:00	100%
25	✓	Revisar Protótipo	72 horas	13,875 dias?	30/09/24 08:00	17/10/24 16:00	100%
26		Desenvolvimento	391,2 horas	33,15 dias?	17/10/24 1	04/12/24 08:12	0 %
27		Sprint 1	124,8 horas	14,6 dias?	17/10/24 1	07/11/24 11:48	0 %
28		Implementação	108 horas	13,5 dias?	17/10/24 1	06/11/24 11:00	0 %

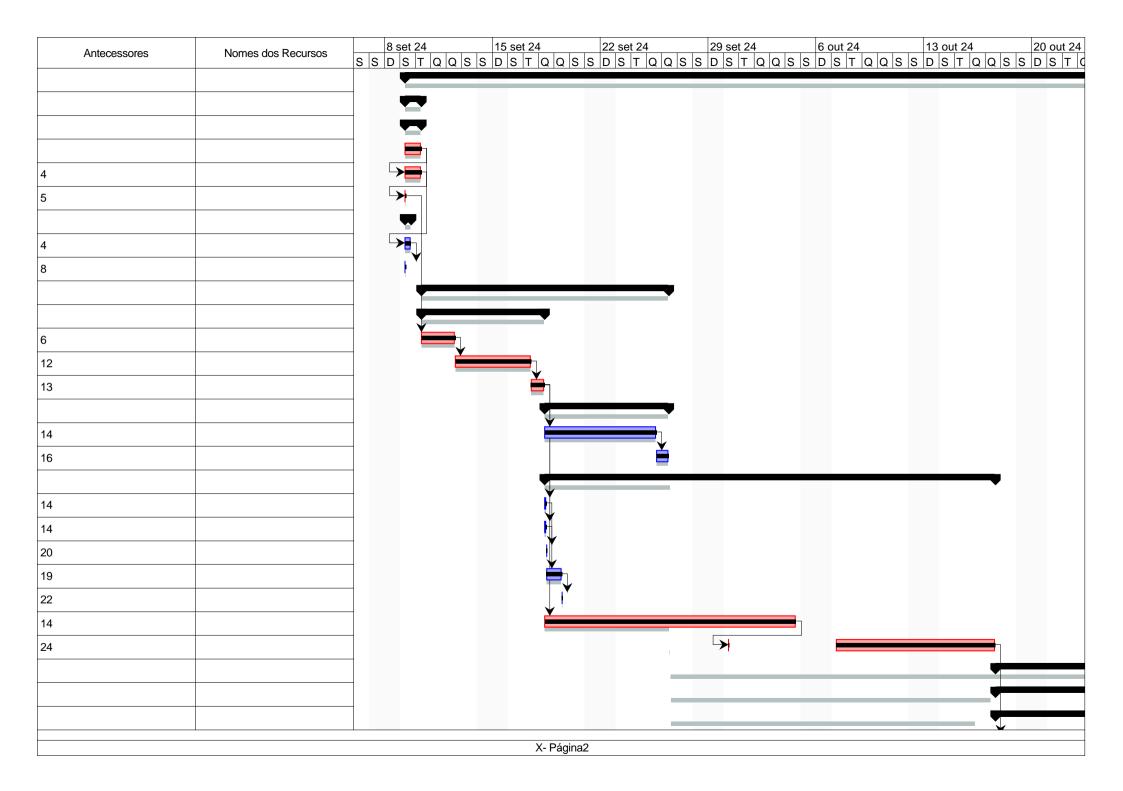


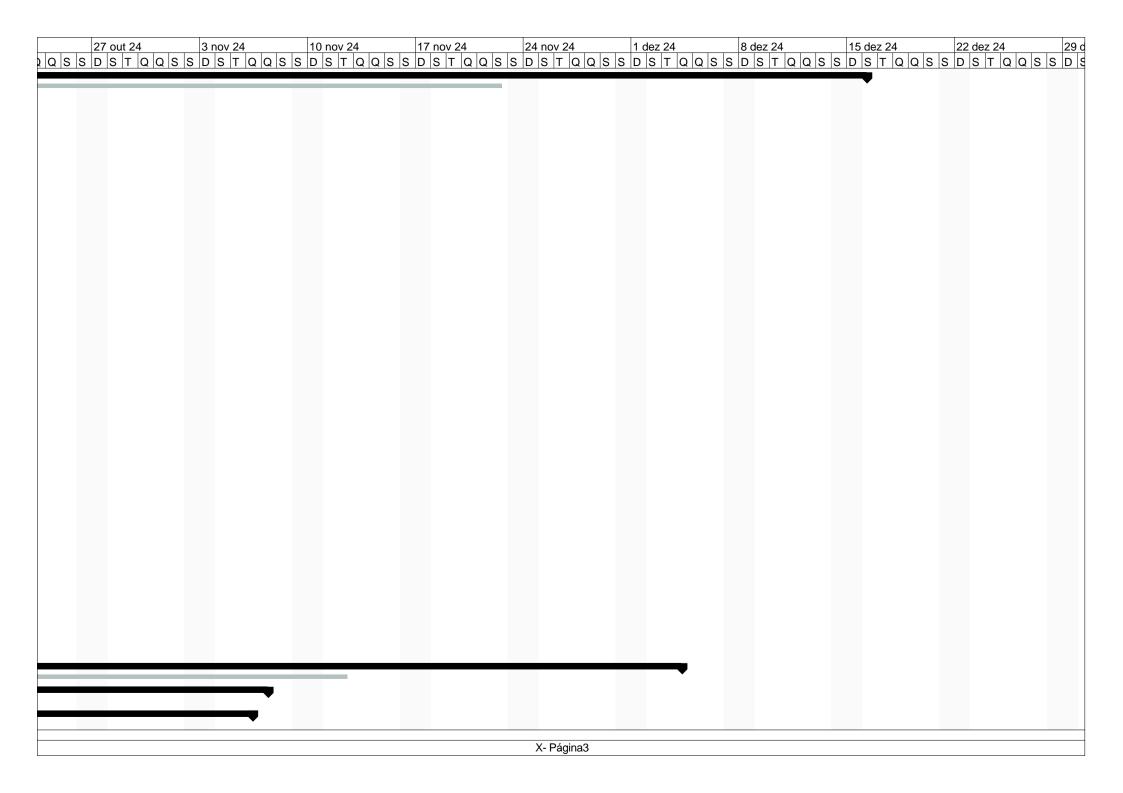

	ez 24															
е	z 2	4				5 j	an	25					12	jar	າ 2	5
5	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q
E																
							X-	Pá	gina	a4						

	(A)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
29		Manter Usuários	40 horas	5 dias?	17/10/24 16:00	24/10/24 16:00	0%
30		Realizar Testes	8 horas	1 dia	24/10/24 16:00	25/10/24 16:00	0%
31		Manter IZZY's	50 horas	6,25 dias?	25/10/24 16:00	05/11/24 09:00	0%
32		Realizar Testes	10 horas	1,25 dias?	05/11/24 09:00	06/11/24 11:00	0%
33		Monitoramento e Controle	16 horas	1 dia?	06/11/24 1	07/11/24 11:00	0 %
34		Status Report	8 horas	1 dia?	06/11/24 11:00	07/11/24 11:00	0%
35		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	06/11/24 11:00	07/11/24 11:00	0%
36		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias?	07/11/24 1	07/11/24 11:48	0 %
37		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias?	07/11/24 11:00	07/11/24 11:48	0%
38		Sprint 2	154,8 horas	11,85 dias?	07/11/24 1	25/11/24 10:36	0 %
39		Implementação	138 horas	9,75 dias?	07/11/24 1	21/11/24 09:48	0 %
40		Manter Membros de um IZZY	50 horas	6,25 dias	07/11/24 11:48	15/11/24 14:48	0%
41		Realizar Testes	10 horas	1,25 dias?	15/11/24 14:48	18/11/24 16:48	0%
42		Manter Atividades	65 horas	8,125 dias?	07/11/24 11:48	19/11/24 13:48	0%
43		Realizar Testes	13 horas	1,625 dias?	19/11/24 13:48	21/11/24 09:48	0%
44		Monitoramento de Controle	16 horas	2 dias?	21/11/24 0	25/11/24 09:48	0 %
45		Status Report	8 horas	1 dia?	21/11/24 09:48	22/11/24 09:48	0%
46		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	22/11/24 09:48	25/11/24 09:48	0%
47		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	25/11/24 0	25/11/24 10:36	0 %
48		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	25/11/24 09:48	25/11/24 10:36	0%
49		Sprint 3	52,8 horas	3 dias?	25/11/24 1	28/11/24 10:36	0 %
50		Implementação	36 horas	3 dias?	25/11/24 1	28/11/24 10:36	0 %
51		Manter Fotos	20 horas	2,5 dias	25/11/24 10:36	27/11/24 15:36	0%
52		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	27/11/24 15:36	28/11/24 10:36	0%
53		Relatório de Atividades	10 horas	1,25 dias?	25/11/24 10:36	26/11/24 13:36	0%
54		Realizar Testes	2 horas	0,25 dias?	26/11/24 13:36	26/11/24 15:36	0%
55		Monitoramento de Controle	16 horas	1 dia?	26/11/24 1	27/11/24 15:36	0 %
56		Status Report	8 horas	1 dia?	26/11/24 15:36	27/11/24 15:36	0%
				X- Página	a5		


Antecessores	Nomes dos Recursos	8 s S S D	set 24 S T Q Q S	15 set	T Q Q S	22 set 2	24	29 set 24	Q S S I	S out 24	13 2 S S D	out 24	20 out 24
25		0 10 12	0 1. 4 4 5		.	0 12 10 1.		D O I Q		<u> </u>	X O O D		
29													
30												_	
31												_	
												_	
32												_	
32												_	
												1	
35;34												1	
												_	
												_	
37												_	
40													
37												_	
42													
43													
45													
46;45													
48													
51													
48													
53													
54													
					X- Página	6			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

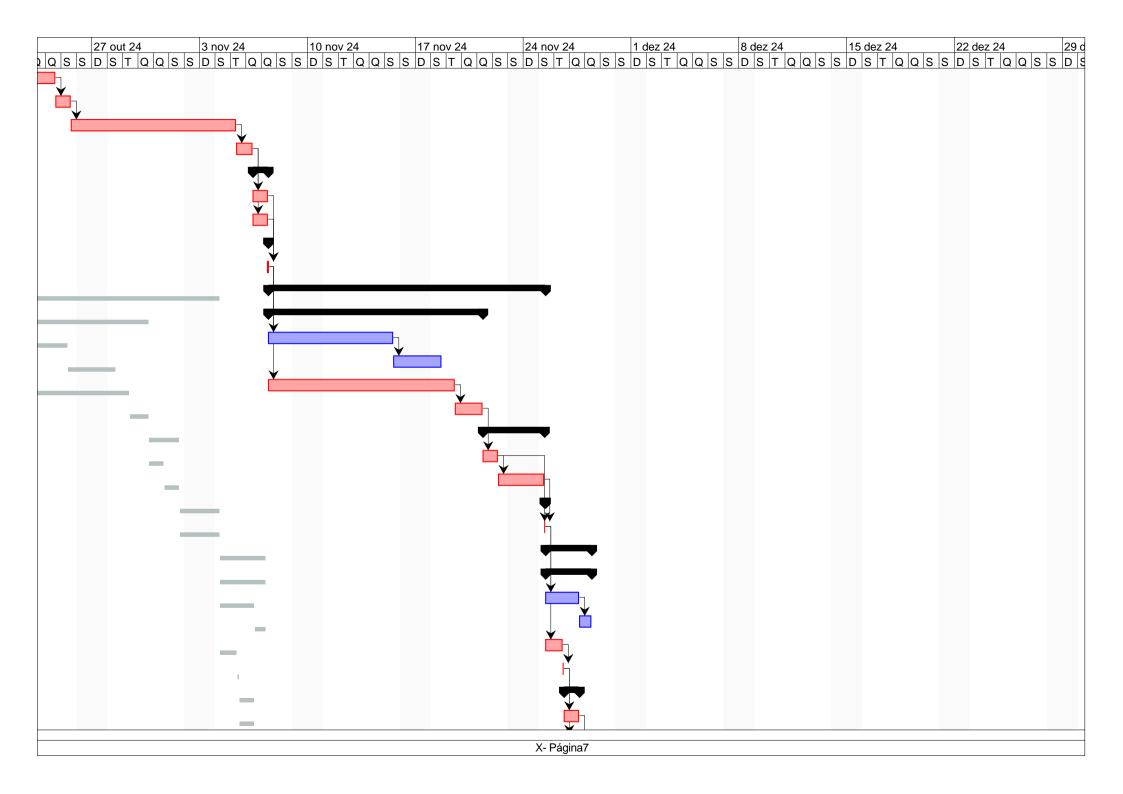

ez 24		ez 24 5 ian 25 12 ian 25															
	е	z 2	4				5 j	an	25					12	jar	າ 2	5
X- Página8	_	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
X- Página8																	
	L							X-	Pá	gina	a8						

	®	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim	Completo por cento
57		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	26/11/24 15:36	27/11/24 15:36	0%
58		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	27/11/24 1	27/11/24 16:24	0 %
59		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	27/11/24 15:36	27/11/24 16:24	0%
60		Sprint 4	58,8 horas	4,1 dias?	27/11/24 1	04/12/24 08:12	0 %
61		Implementação	42 horas	3 dias?	27/11/24 1	02/12/24 16:24	0 %
62		Relatório de Atividades Atrasa	15 horas	1,875 dias	27/11/24 16:24	29/11/24 15:24	0%
63		Realizar Testes	3 horas	0,375 dias	29/11/24 15:24	02/12/24 09:24	0%
64		Relatório de Participação dos	20 horas	2,5 dias?	27/11/24 16:24	02/12/24 11:24	0%
65		Realizar Testes	4 horas	0,5 dias?	02/12/24 11:24	02/12/24 16:24	0%
66		Monitoramento de Controle	16 horas	1 dia?	02/12/24 1	03/12/24 16:24	0 %
67		Status Report	8 horas	1 dia?	02/12/24 16:24	03/12/24 16:24	0%
68		Atualizar Cronograma	8 horas	1 dia?	02/12/24 16:24	03/12/24 16:24	0%
69		Gerência de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	03/12/24 1	04/12/24 08:12	0 %
70		Gerar nova Tag de Configuração	0,8 horas	0,1 dias	03/12/24 16:24	04/12/24 08:12	0%
71		Fechamento	64 horas	8 dias?	04/12/24 0	16/12/24 08:12	0 %
72		Apresentação do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	04/12/24 08:12	06/12/24 08:12	0%
73		Entrega do projeto ao cliente	16 horas	2 dias?	06/12/24 08:12	10/12/24 08:12	0%
74		Implantação do sistema	32 horas	4 dias?	10/12/24 08:12	16/12/24 08:12	0%
75	Ö	Finalização	0 horas	0 dias?	16/12/24 08:12	16/12/24 08:12	0%

Antecessores	Nomes dos Recursos	s s	8 set 24	15 0 S S D	5 set 24	22 se	t 24 T Q Q S S	29 set 24	6 ou	ut 24	13 c	out 24	20 ou	t 24
54			12 0 . 0	(0 0 1		0 0 2 0	. 4 4 5 5	12 0 . 0 .	. 10 10 12 1	, , , , , , , , ,	0 12 1	<u> </u>	0 0 2 0	
56;57														
59														
62														
59														
64														
65														
65														
67;68														
70														
72														
73														
74														
	,													
					X- Págii	na10								

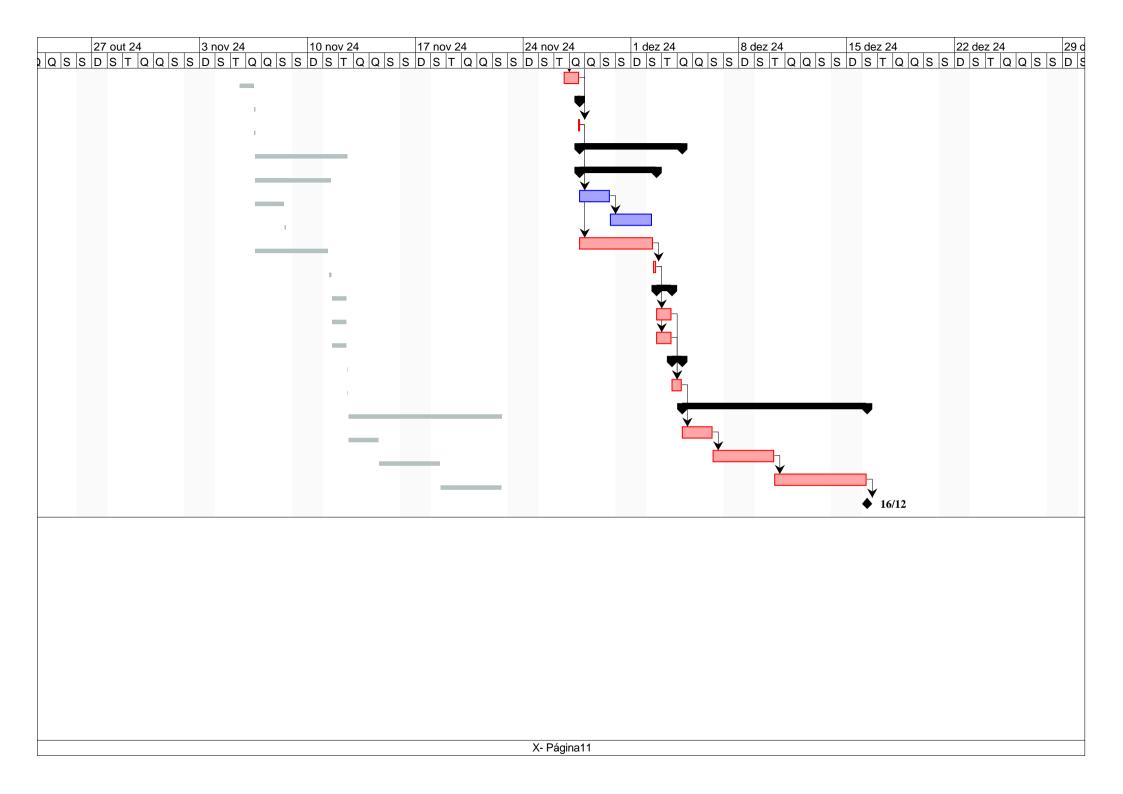

ez 2	24	_	-	_	5 j	an	25	1_	1_	S	_	12 D	jar	1 2:	5
T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	Т	Q
						V 1	Dá.		10						
						X-	ra	gina	112						
